

고베항 항로(-12m) 준설공사(추가4) 작업 안내

고베항 항로(-12m) 준설공사를 아래와 같이 실시합니다.
부근을 항행하는 선박은 작업선의 운항 등에 최대한 주의해서 항행하시기 바랍니다.

연락처	
발주자: 국토교통성 긴키지방정비국 고베항만사무소 제1건설관리관실	전화: 078-331-6703
시공자: 와카치쿠·아오미·혼마JV JV고베항작업소	전화: 050-5526-5570
소장 시노하라 와타루	전화: 090-4564-5253



1. 공사 기간

2022년 6월 16일 ~
2022년 8월 31일
(상기 기간은 예비일 포함)
작업 시간: 일출 ~ 일몰

공사 종류	월별	2022년								비고	
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월		
준비		10:20									
준설			10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20			
토사운반선 운반											해당 작업 기간
양토 처분											//
정리											예비일 포함

2. 공사 내용

아래 그림의 시공 구역에서 사석 굴삭, 적재, 운반, 투입을 실시합니다.

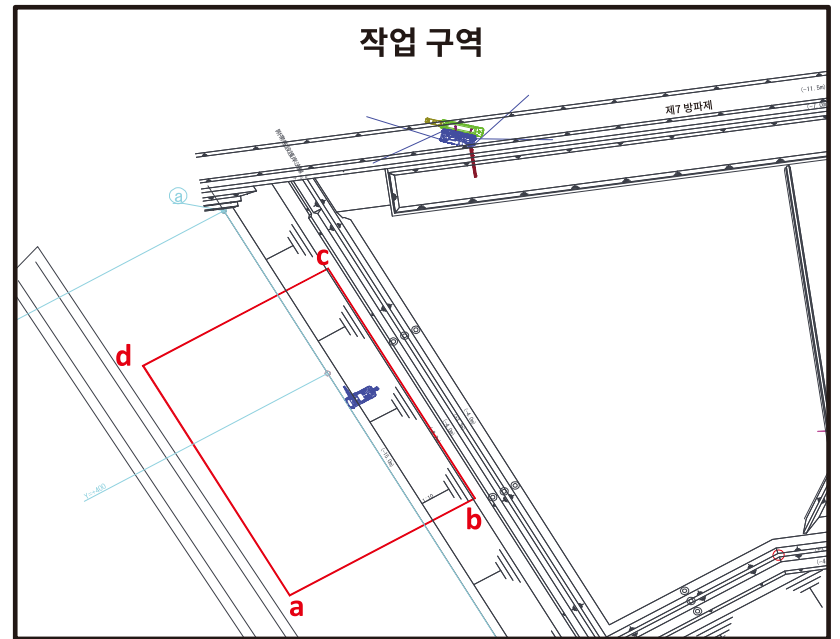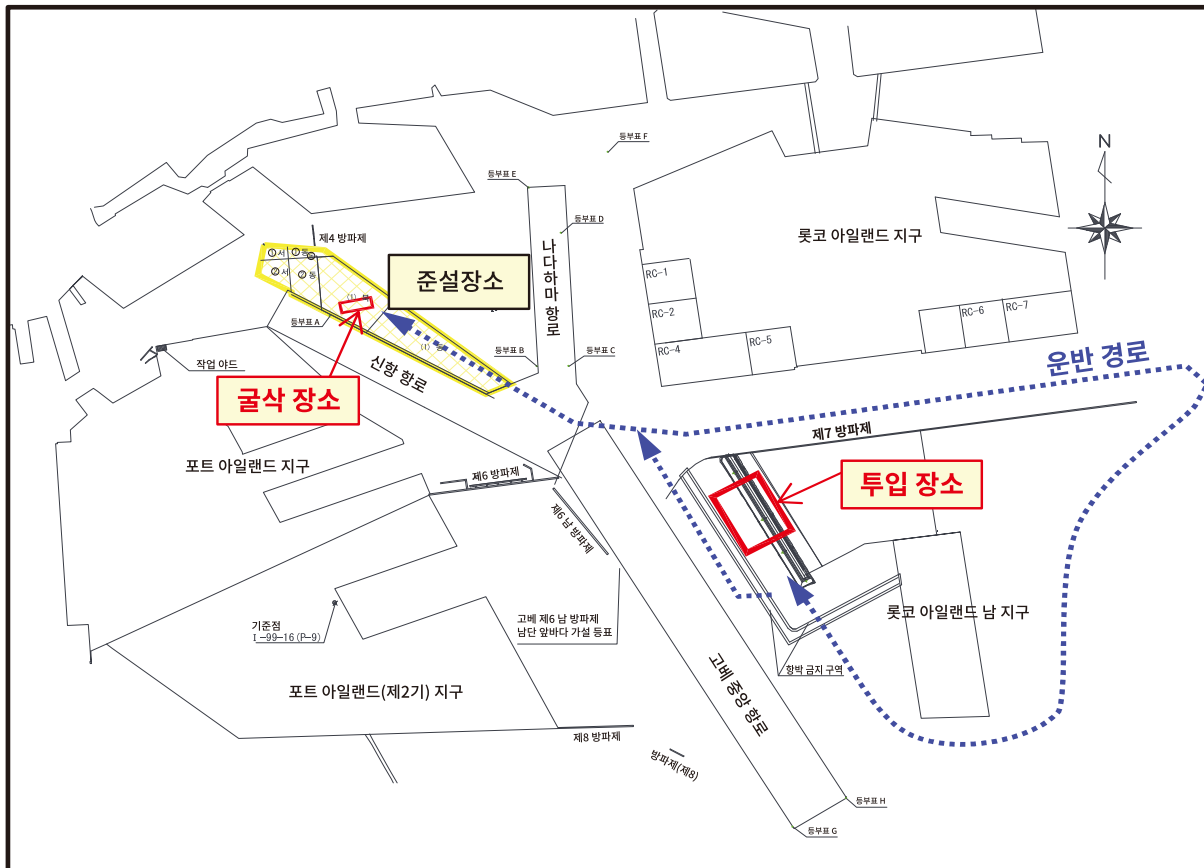


아래 표의 지점 a~d를 연결하는 직선으로 둘러싸인 구역입니다.

지점명	시점	방위	거리
a 점	N34-40-14.31 E135-14-43.59	진방위: 113° 52' 56"	1,655m
b 점	a 점으로부터	진방위: 59° 54' 46"	413m
c 점	b 점으로부터	진방위: 329° 56' 19"	565m
d 점	c 점으로부터	진방위: 239° 55' 27"	413m


3. 작업 개요

① 사석 운반 상황

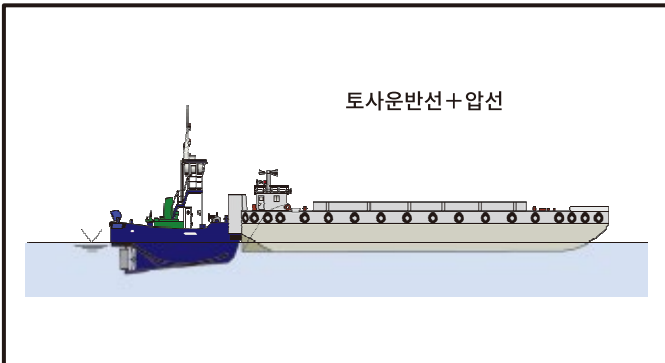


준설선을 이용하여 굴삭한 사석을 토사운반선에 적재하여 위의 운반 경로를 통해 투입 장소까지 운반합니다.

② 사석 환적 상황

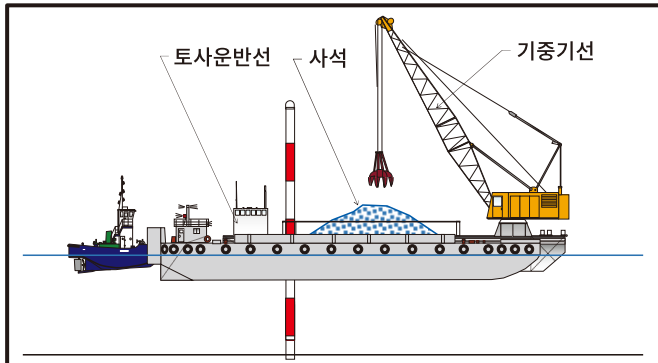

투입 장소 부근에서 토사운반선을 기중기선에 접현시켜 운반한 사석을 환적합니다.

③ 사석 투입 상황

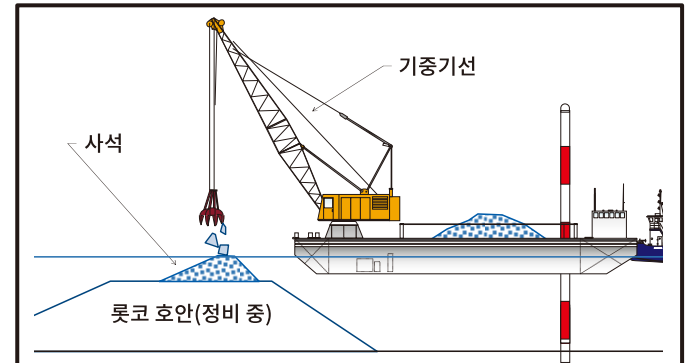

환적한 사석은 기중기선을 이용하여 직접 투입 위치에 투입합니다.

4. 안전 대책

- 공사 작업선에는 해상충돌예방법에 규정하는 등화 및 형상물과 ①작업선 기를 내걸습니다.
- 공사 기간 중에는 정보를 제공하고 주의를 환기하여 항행 선박의 안전 확보에 노력합니다.
- 공사의 ②작업 중지 기준은 오른쪽 표와 같습니다.
- 작업선의 야간 정박 시에는 작업 구역 부근의 일반 선박 항행에 지장이 없는 위치에서 정박합니다. 또, 다른 선박에 지장을 주지 않는 범위 내에서 자선의 존재를 알리는 조명을 설치합니다.

① 작업선 기



② 작업 중지 기준

풍속	10m/sec 이상(10분간 평균 풍속)
파고	1.0m 이상(유의 파고)
시정	2,000m 이하
이상 기상 등	<ul style="list-style-type: none"> 태풍이나 고조와 같은 이상 기상이 예상되는 경우 - 쓰나미 주의보나 경보가 발표되는 경우 - 항장의 권고가 있는 경우 - 기타, 공사 작업 현장 책임자가 작업 속행이 위험하다고 판단한 경우
