

关于神户港航路(-12m)疏浚工程(追加3)作业的通知

如下所述实施神户港航路(-12m)疏浚工程。
请附近航行的船舶充分注意作业船的航行等情况后再航行。

联系方式	
发包者: 国土交通省 近畿地方整備局 神户港湾事务所 第一建设管理官室	电话: 078-331-6703
施工者: 若筑・AOMI・本間JV JV神户港作业所 所长 筱原 涉	电话: 050-5526-5570 电话: 090-4564-5253



1.工期及作业时间

2022年6月1日~2022年8月31日
(上述期间内含预备日)
作业时间: 日出~日落

工种	月份	2022年							备注		
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月	
准备工作		10:20									
疏浚工程											
运土船搬运工程											符合的作业期间
淤泥丢弃工程											//
后续整理工作											含预备日

2.工程内容

在下图所示的施工区域内,进行砖块吊起回收和装船、搬运、临时放置作业。

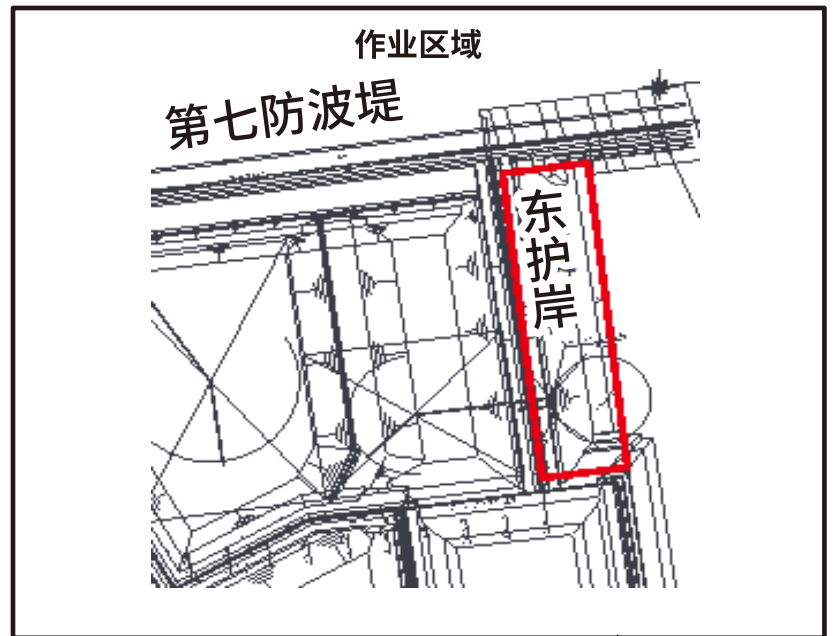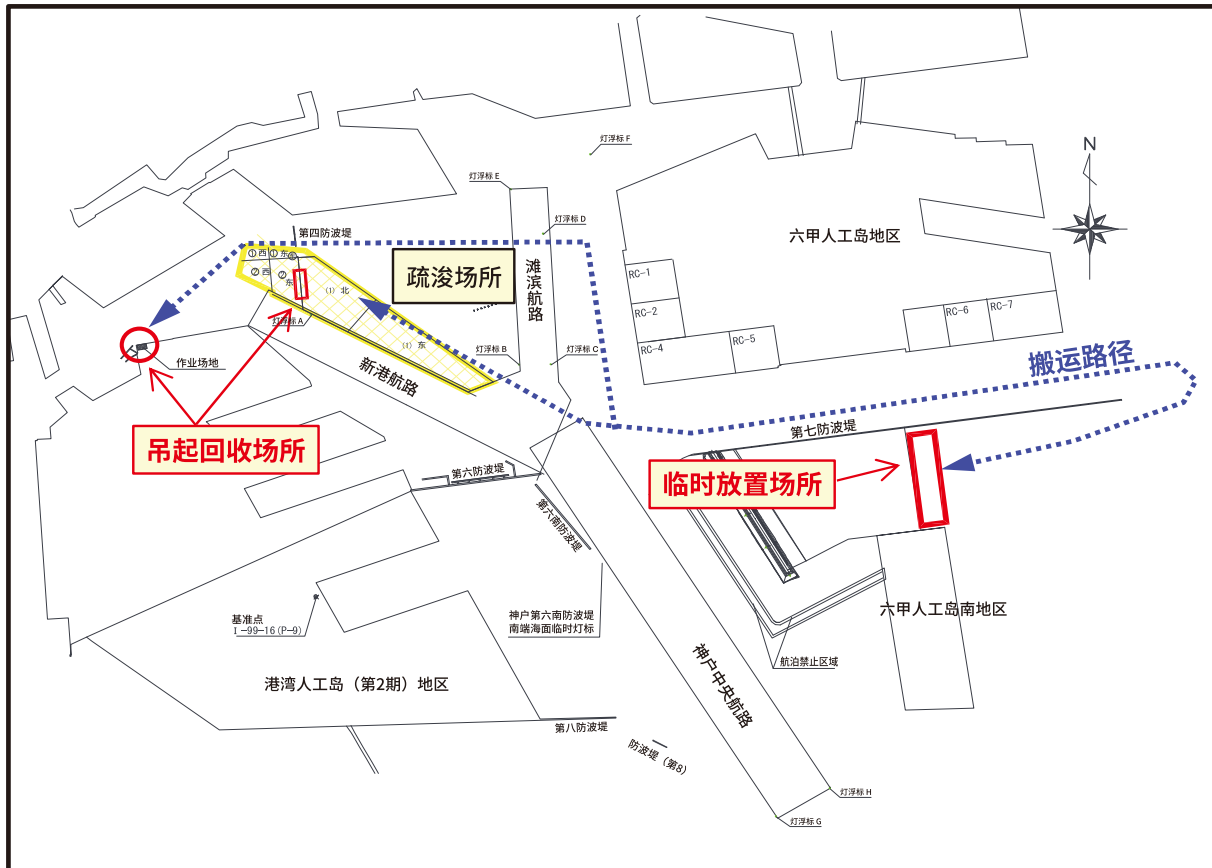


依次连接下表的地点a~d各点的直线所围成的区域。

地点名	起点	方位	距离
a点	从神户第6防波堤灯塔起 N34-40-14.31 E135-14-43.59	真方位: 83° 39' 11"	3,176m
b点	从a点起	真方位: 173° 48' 51"	822m
c点	从b点起	真方位: 262° 42' 26"	209m
d点	从c点起	真方位: 353° 48' 53"	822m


3.作业概要

①砖块吊起回收和装船样子

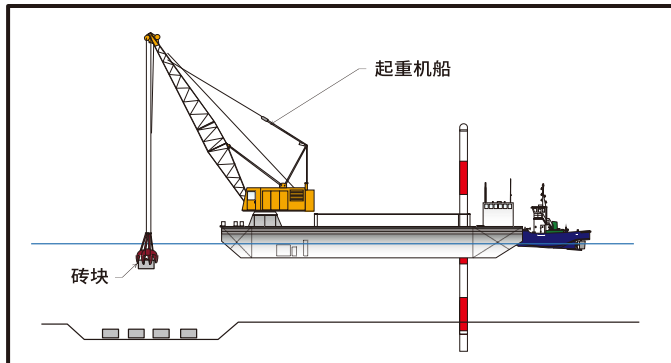


将临时放置在疏浚场所及港湾人工岛场地的砖块用起重船吊起并回收。

②砖块搬运样子

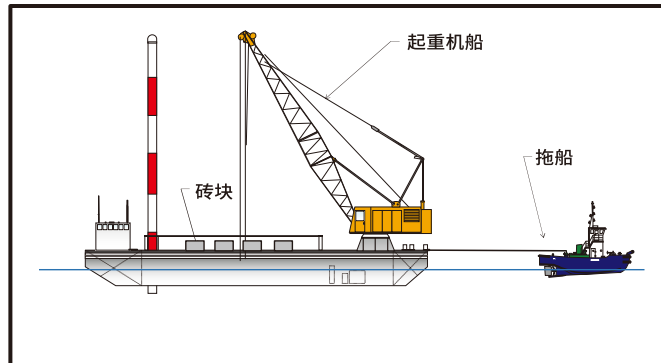

将装入起重机的砖块通过上述搬运路径搬运。

③砖块临时放置样子

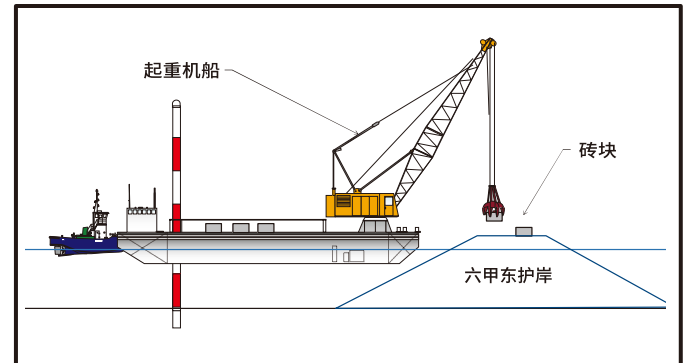

将起重船搬运的砖块临时放置到六甲东护岸。

4.安全对策

- 施工作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火和形象物及①作业船旗。
- 施工期间,提供信息和提请注意,努力确保航行船舶的交通安全。
- 工程的②作业中止基准,如右表所示。
- 作业船夜间停泊时,停泊在作业区域附近对一般船舶航行不构成妨碍的位置。此外,在对其他船舶不构成妨碍的范围内进行照明以显示自身船只的存在。

①作业船旗



②作业中止基准

风速	10m/s以上 (10分钟内平均风速)
波高	1.0m以上 (有效波高)
能见度	2,000m以下
异常气象等	<ul style="list-style-type: none"> · 预想会发生台风、高潮等异常气象时 · 发布海啸注意报、警报时 · 港长发出劝告时 · 其他施工作业现场负责人判断继续作业会有危险时
